PROGETTO

AREA PRU BORGONUOVO

PIANO ATTUATIVO EX COMPARTO 2
IN VARIANTE AL P.G.T.
Località Borgochiesanuova - Mantova

COMMITTENTE

SANSEDONI SIENA SPA
Via Giuseppe Garibaldi, 60 - 53100 Siena

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI MANTOVA

COMUNE DI MANTOVA

CONTENUTO

Cronoprogramma

INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA
Via Giorgio Gaber / Strada Circonvallazione Sud	Mantova	Mantova

DATA EDIZIONE	DATA ULT. AGG.	ELABORATO
10/01/2022		
PROT. 347/2021		F

PROGETTISTA

ARCHITETTO PAOLO VINCENZI
Corso Vittorio Emanuele II, 33 - 46100 Mantova
0376 224380 - pmvinc@tin.it

PROGETTISTA

SOPRINT SRL SOCIETÀ PROGETTAZIONI INTEGRATE
Galleria Ferri, 6 - 46100 Mantova
0376 222077 - soprint@libero.it

Comune di Mantova

Provincia di Mantova

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei Lavori

OGGETTO:	PIANO ATTUATIVO EX COMPARTO 2 IN VARIANTE AL P.G.T. Località Borgochiesanuova - Mantova Opere di urbanizzazione
COMMITTENTE:	SANSEDONI SIENA S.p.A..

Mantova, _____

IL TECNICO

_____

(Arch. Fanti Alessandro)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
Recinzione e apprestamenti del cantiere		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	2
Apprestamenti del cantiere		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1
Impianti di servizio del cantiere		
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1
Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici		
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	1	1
Scavo di sbancamento	13	17
Realizzazione sottoservizi		
Scavo a sezione obbligata	10	12
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	2	2
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	2	2
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3	3
Posa di conduttura acque meteoriche	14	22
Strada		
Sede stradale		
Formazione di rilevato stradale	15	19
Formazione di fondazione stradale	10	12
Formazione di manto di usura e collegamento	10	12
Opere d'arte per lavori stradali		
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5	5
Cordoli, zanelle e opere d'arte	9	12
Realizzazione di marciapiedi	10	12
Opere complementari per sede stradale		
Posa di segnaletica verticale	3	3
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	6
Pulizia di sede stradale	6	8
Pubblica illuminazione		
Realizzazione di impianto di messa a terra	5	5
Posa di pali per pubblica illuminazione	4	4
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	4
Opere del verde		
Abbattimento alberi meccanizzato	5	5

Decespugliamento di area boscata	3	3
Piantumazione arborea localizzata	10	12
Piantumazione di essenze arboree	3	3
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	5	5
	12	16
Formazione di tappeto erboso	4	4
Smobilizzo del cantiere	2	2

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	3 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Apprestamenti del cantiere	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Impianti di servizio del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici	1 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura esegu	1 g
Scavo di sbancamento	13 g
Realizzazione sottoservizi	13 g
Scavo a sezione obbligata	10 g
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	2 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g
Posa di conduttura acque meteoriche	14 g
Strada	101 g
Sede stradale	39 g
Formazione di rilevato stradale	15 g
Formazione di fondazione stradale	10 g
Formazione di manto di usura e collegamento	10 g
Opere d'arte per lavori stradali	39 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	9 g
Realizzazione di marciapiedi	10 g
Opere complementari per sede stradale	13 g
Posa di segnaletica verticale	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g
Pulizia di sede stradale	6 g
Pubblica illuminazione	68 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g

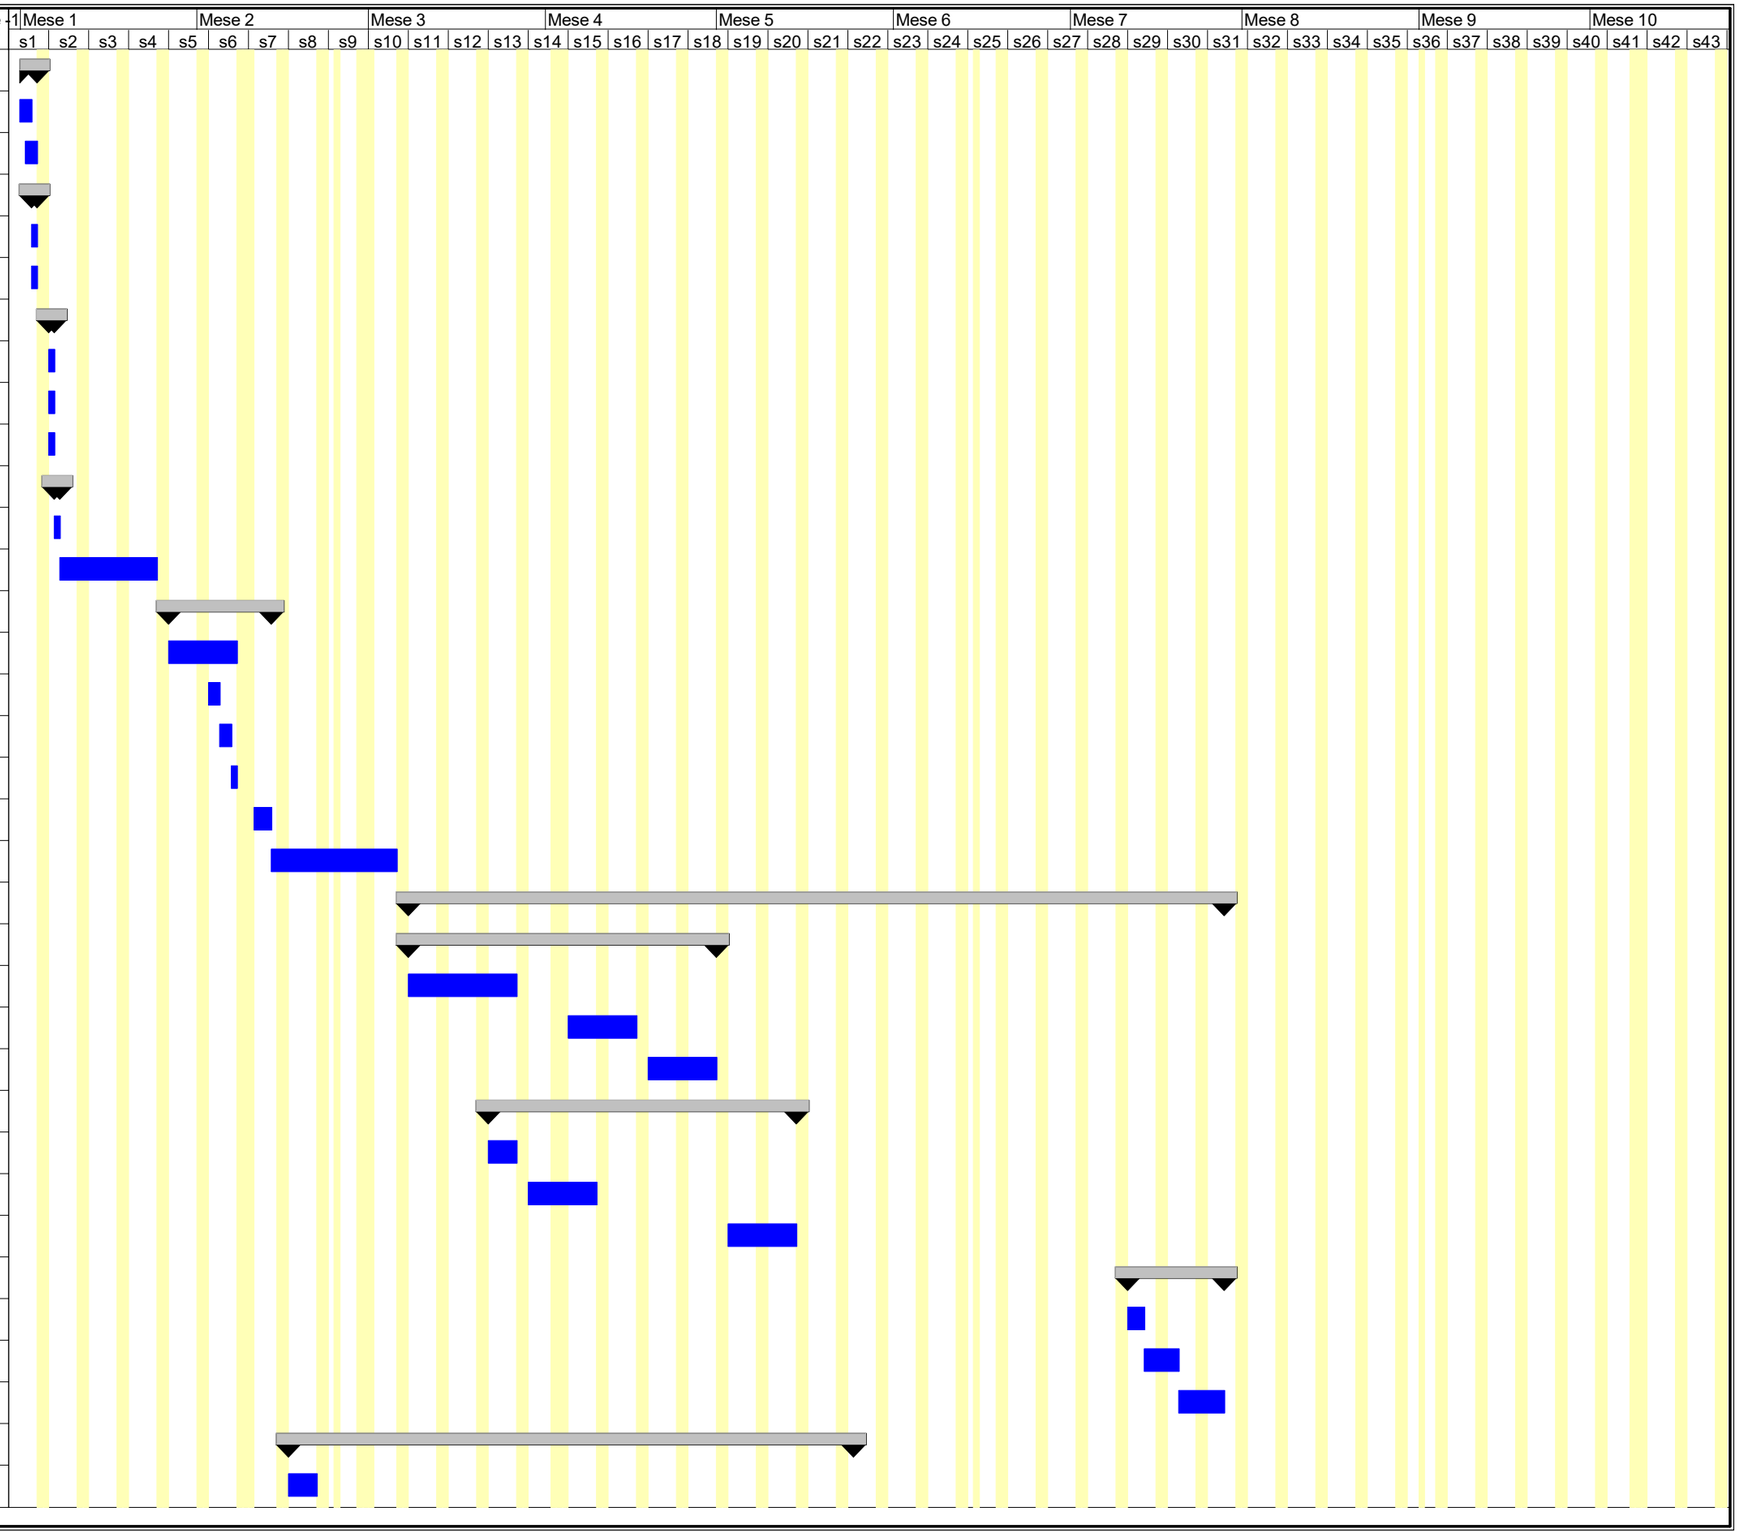
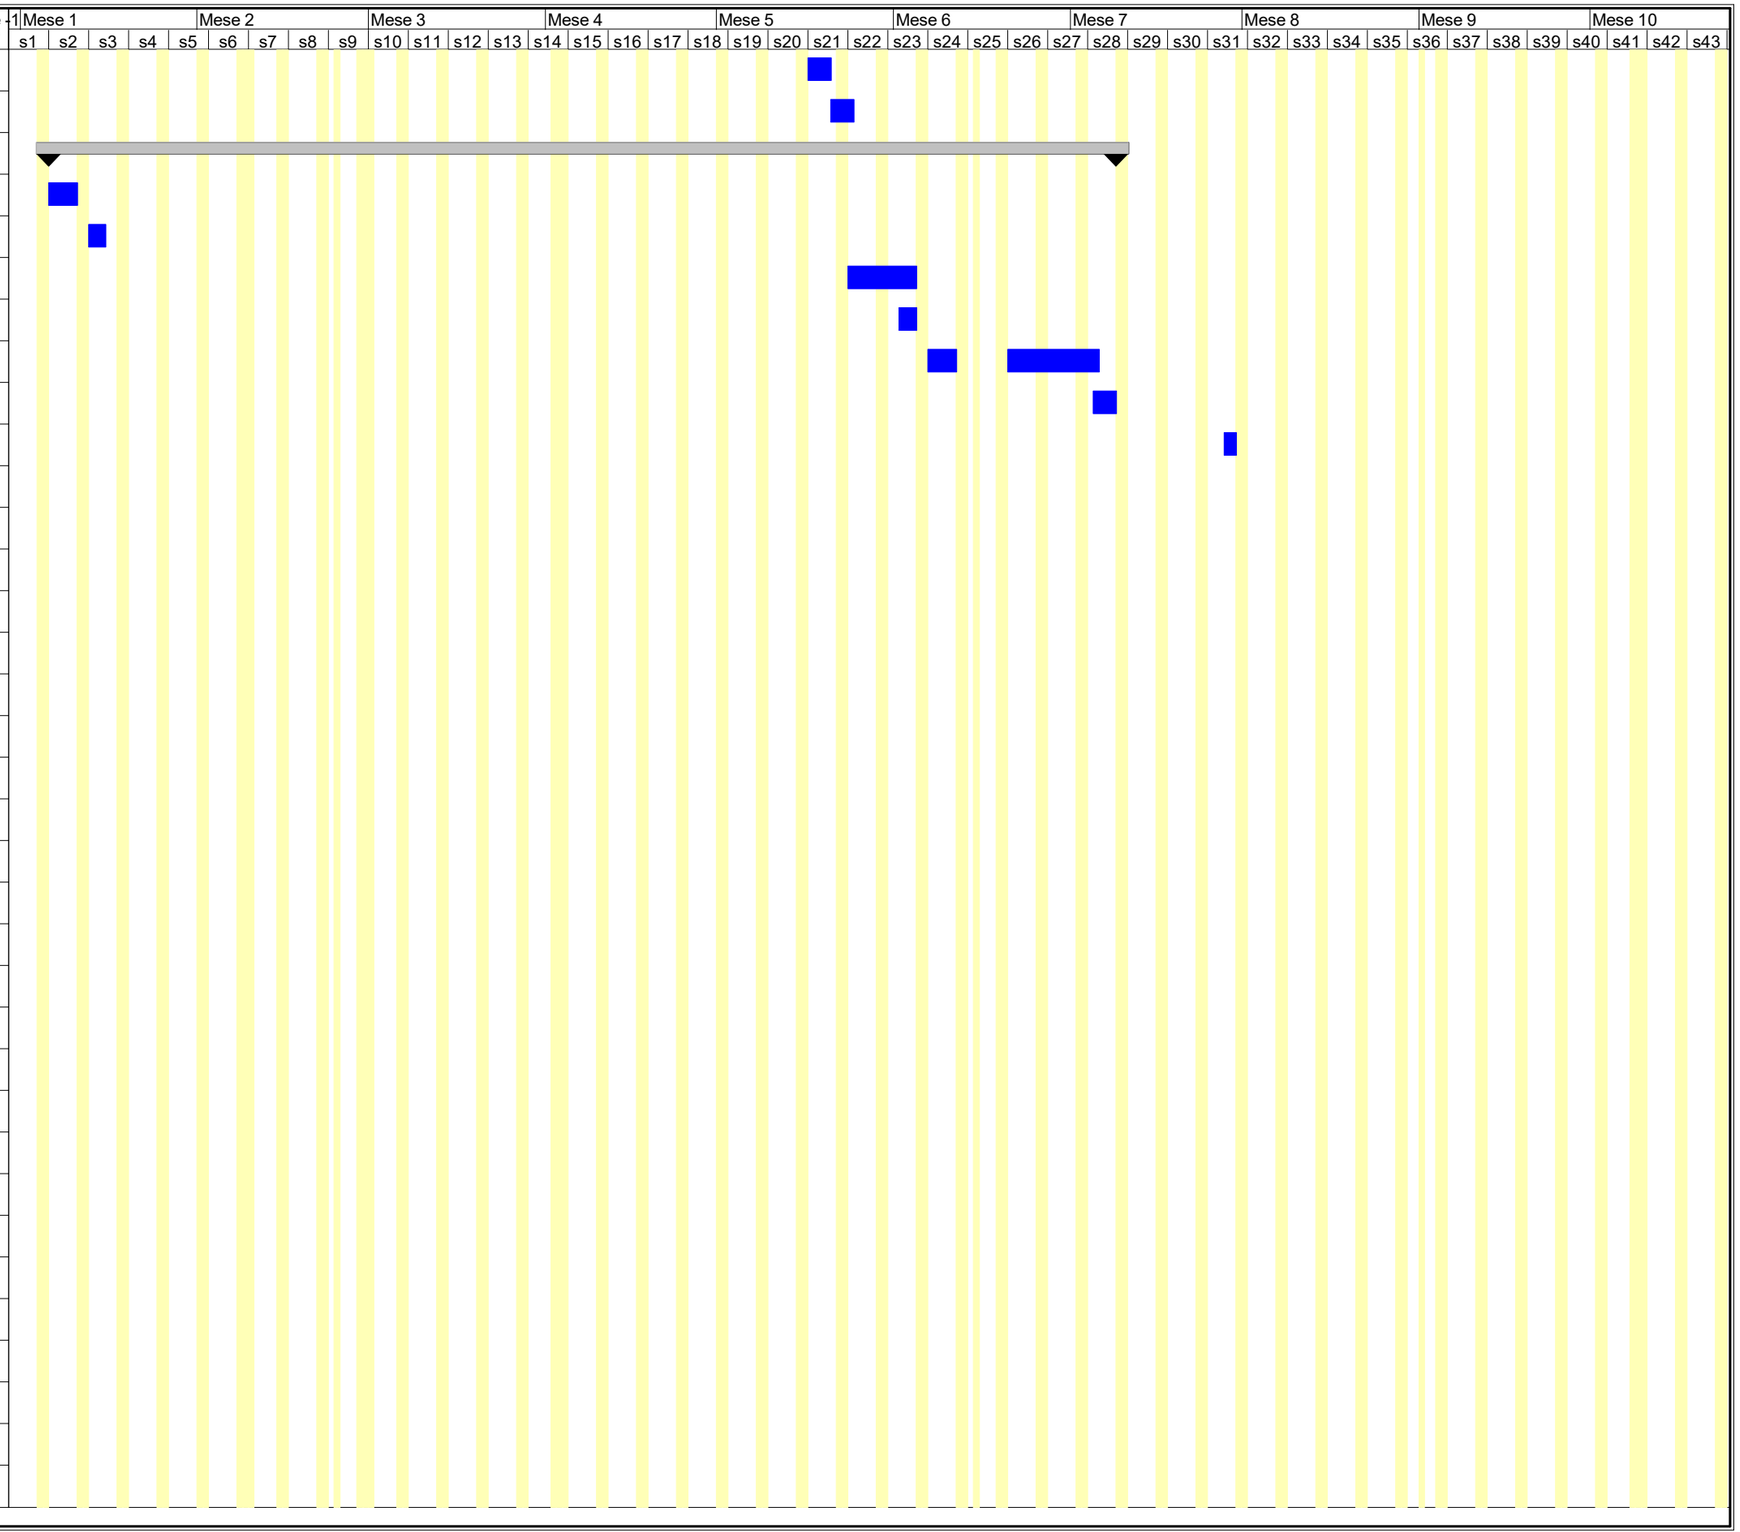
Nome attività	Durata
Posa di pali per pubblica illuminazione	4 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g
Opere del verde	130 g
Abbattimento alberi meccanizzato	5 g
Decespugliamento di area boscata	3 g
Piantumazione arborea localizzata	10 g
Piantumazione di essenze arboree	3 g
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	17 g
Formazione di tappeto erboso	4 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
